แผนงานและผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง ชลบุรี - พัทยา

มูลค่างานตามสัญญา 3,969,623,460.21 บาท ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 1,454 วัน (เดิม 1,077 วัน)

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ตุลาคม 2559 (เดิมวันที่ 12 ตุลาคม 2559)

ผู้ว่าจ้าง : กรมทางหลวง(DOH) ที่ปรึกษา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา(TTDT) ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์(AMTW)

ลำดับที่	รายการ	มูลค่างาน (บาท)	% ของงานทั้งหมด	% ความก้าวหน้าสะสม		(+)/(-) ส่วนต่างจากแผน
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES	2,514,550.00	0.063%	Plan	71.005%	3.063%
				Actual	74.068%	
2	EARTHWORK	235,577,296.00	5.935%	Plan	90.071%	2.745%
				Actual	94.715%	
3	SUBBASE AND BASE COURSES	61,312,720.10	1.545%	Plan	88.116%	10.036%
				Actual	98.972%	
4	SURFACE COURSES	319,636,138.10	8.052%	Plan	77.276%	12.238%
				Actual	89.404%	
5	STRUCTURES	25,624,856.99	0.646%	Plan	95.276%	3.919%
				Actual	99.215%	
6	MISCELLANEOUS	149,081,139.89	3.756%	Plan	82.990%	-6.673%
				Actual	81.315%	
7	BUILDING WORK	1,031,716,440.59	25.990%	Plan	88.611%	8.254%
				Actual	96.867%	
8	TOLL COLLECTION SYSTEM	942,861,853.95	23.752%	Plan	79.263%	-0.959%
				Actual	78.064%	
9	TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE SYSTEMS	1,173,442,222.97	29.561%	Plan	84.220%	2.273%
				Actual	86.493%	
10	TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	27,331,674.20	0.701%	Plan	86.029%	0.066%
				Actual	93.023%	
	รวมมูลค่างานของโครงการ	3,969,594,082.79	100.000%	Plan	82.463%	3.652%
				Actual	86.115%	

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 1,454 วัน
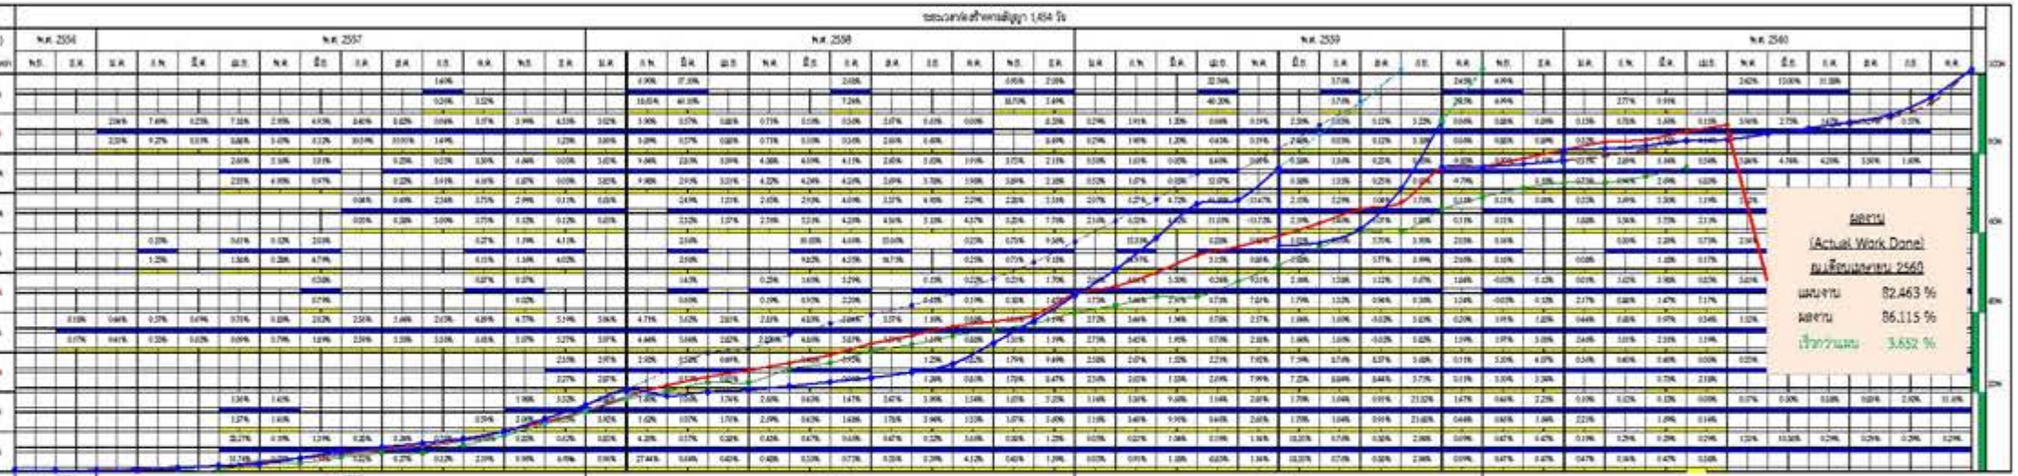
แผนงาน (Planning)	ร้อยละของงานเดิม	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
	ค่างบนเงิน/ส่วนเกิน	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
แผนงาน (Planning)แก้ไขครั้งที่ 1	ร้อยละของงานเดิม	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
	ค่างบนเงิน/ส่วนเกิน	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
แผนงาน (Planning)แก้ไขครั้งที่ 2	ร้อยละของงานเดิม	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
	ค่างบนเงิน/ส่วนเกิน	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
แผนงาน (Planning)แก้ไขครั้งที่ 3	ร้อยละของงานเดิม	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
	ค่างบนเงิน/ส่วนเกิน	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
แผนงาน (Planning)แก้ไขครั้งที่ 4	ร้อยละของงานเดิม	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
	ค่างบนเงิน/ส่วนเกิน	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
ผลงาน (Actual Work Done)	ร้อยละของงานเดิม	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
การเบิกจ่าย (Actual Payment)	ค่างบนเงิน/ส่วนเกิน	ตามเดือน/สะสมเดือน
		ตามปีงบ/สะสมเดือน
